

Beilage Filiale 2

- **Ergebnisse der Erhebungen 2025 (Excel-Tabellen)**

Filiale F2

N1/16 Kerzers - Forsthaus

Stand/Datum: 05.Jun 2025 Elvis Mehic 104

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)												alle					
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Globale Höhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >GW		Projektmanagement (PM)										Anzahl Gebäude mit Lr >GW					
			bis 2015 notwendig?	Lärmschutzwand (m²)						Lärmschutzdämm (m²)	Beilag Kat. III, z.B. PA (m²)	Beilag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erförderungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Projektphase				Datum	PGV Datum	PGV rechtskräftig?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr >GW		
																		MP-Nr.	Bezeichnung	G/PEK	AP/MK			DP/MP	Realisierung		Einreichung AP bei GS-UVEK	Projektbezeichnung	Nein			Ja		Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
N1+, 1450,239	N1+, 1620,259	X					17'707		3'715	10'716	0	71'975	0	0	12'773'825	146	124																		
N1+, 1450,239							580	1							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus																
N1+, 1450,821							539	3	260						364'000			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1451,465							679	3	483						678'200			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1460,193							570	1							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031	1'375						
N1+, 1460,768							950	1							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1470,740							1'318	1							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1490,81							1'020	1							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1500,113							559	3	920						1'288'000			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1500,673							627	3	1'332						1'864'800			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1510,311							680	3		1858					1'300'600			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1520,0							990	2							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1530,2							804	2	630	748					1'405'600			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1530,808							481	3							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031					ZEL N1 Frauenkappelen		
N1+, 1540,300							467	3							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031					ZEL N1 Frauenkappelen		
N1+, 1540,769							443	3		2192					1'534'400			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031	160				ZEL N1 Frauenkappelen		
N1+, 1550,213							420	3	90	709,5					622'650			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031					ZEL N1 Frauenkappelen		
N1+, 1550,634							738	3							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031	2835				ZEL N1 Frauenkappelen		
N1+, 1560,372							630	1							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1570,0							618	3		1764					1'234'800			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1570,619							674	3							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031					absorbierende Verkleidung Brücken West (vorg.Massnahme)		
N1+, 1580,305							1'043	1							0			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031					Tunnelsegment Tunnel Brücken		
N1+, 1590,350							418	3				10'450			10'450			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031					absorbierende Verkleidung Brücken Ost (vorg.Massnahme)		
N1+, 1590,772							576	3		664		14'450			479'250			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1600,341							598	3		2780		14'950			1'960'950			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1600,942							439	3				10'975			10'975			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							
N1+, 1610,417							846	3				21'150			21'150			150024	EP Kerzers-Forsthaus									2031							

[illegible]

Filiale F2 **N1/24 Kirchberg-Kriegstetten**
Stand/Datum: 05.Jun 2025 Elvis Mehic **139**

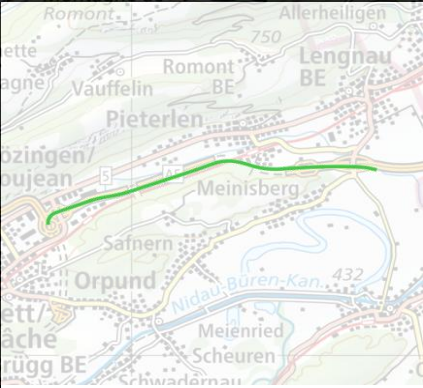
[illegible]

Filiale F2

N5/80 Bienne-Boezingen-Lengnau

Stand/Datum: 05.Jun 2025 Elvis Mehic 70

Erhaltungsplanung (EP)														Projektmanagement (PM)														alle												
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		ASTRA LB	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gloabehöte	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW				Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW								
			bis 2015 notwendig?	Lärmschutzwand (m²)						Lärmschutzdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erficherungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	MP-Nr.	Bezeichnung	Projektphase				Datum	Projektbezeichnung	PGV Datum	PGV rechtskräftig?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)			Lärmschutzdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erficherungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten und vorgesehene Massnahmen
																				Einreichung AP bei GS-UVEK							Nein													
N5+740,302	N5+810,176	X					6'871	1	3'075	5'130	0	44'625	0	0	7'933'275	0	0	220010	EM Bözingenfeld - Lengnau	GP/IEK	AP/IMK	OP/IMP	Realisierung			22	23	24	25	0	0	0	127'158	0	0	127'158	0		Im Rahmen der NV (Netzvollendung) Bei Ost-Ast umgesetzt	
							1'034	1	1'034	1'812		25'375			1'284'375			220010	EM Bözingenfeld - Lengnau										2030					5	0			Im Rahmen der NV (Netzvollendung) Bei Ost-Ast umgesetzt		
							750	1	1'440	687.5		18'750			2'516'000			220010	EM Bözingenfeld - Lengnau										2030					1	0					
							799	1							0			220010	EM Bözingenfeld - Lengnau										2030						19'975	0				
							654	1							0			220010	EM Bözingenfeld - Lengnau										2030						16'347.5	0				
							453	1	150	1640					1'358'000			220010	EM Bözingenfeld - Lengnau										2030						11'320	0				
							1'473	1							0			220010	EM Bözingenfeld - Lengnau										2030						36'817.5	0				
							654	1	1'000						1'400'000			220010	EM Bözingenfeld - Lengnau										2030						16'345	0				
							615	1	480	450					987'000			220010	EM Bözingenfeld - Lengnau										2030						15'375	0				
							439	1		540					378'000			220010	EM Bözingenfeld - Lengnau										2030						10'978	0				



Filiale F2 **N6/24 Brüggmoos- Lyss Süd**
Stand/Datum: 05.Jun 2025 Elvis Mehic **189**

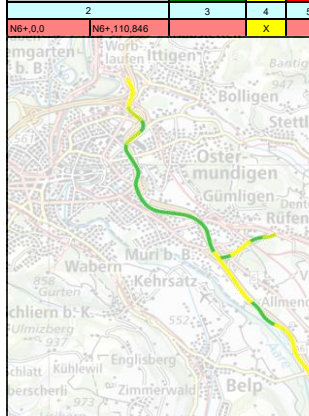
	Erhaltungsplanung (EP)																	Projektmanagement (PM)																	alle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Vorium	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gebaute	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I z.B. SDA 8 + 12 (m²)	Andere Kosten (in CHF)	Erschließungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont einer realisierten Massnahme	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Vorgesahener Realisierungsbeginn											Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I z.B. SDA 8 + 12 (m²)	Andere Kosten (in CHF)		Erschließungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten und vorgeschlagenen Massnahmen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RBS von / bis			bis 2015 notwendig?																Projektbezeichnung gemäss BKM		Projektphase				Einreichung AP bei GS-UV EK			PQV Datum	PQV rechtfertigt?		Datum Genehmigung DP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Filiale F2

N6/28 Lyss Süd - Schönbühl

Stand/Datum: 05.Jun.2025 Elvis Mehic 190

Erhaltungsplanung (EP)																			Projektmanagement (PM)														alle																
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Grobhöhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW				Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEK		PGV Datum	PGV rechtskräftig?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW				
			bis 2015 notwendig?							Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erdichtungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont realisierter Massnahmen	Planungshorizont nicht realisierten Massnahmen	MP-Nr.	Bezeichnung	GPI/EK	AP/IKK	DP/MP		Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	Datum	Nein	Ja		Datum	Vorgeschener Realisierungsbeginn		Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erdichtungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten und vorgesehenen Massnahmen							
			Non	Yes																																													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Bemerkungen / Kommentar															
N6+100A,805	N6+260A,860		X				16990			4'328	0	0	0	0	0	6'059'200	51	51								0	0	0	402'406	0	51	402'406	51																
							625	1	748							1'047'200								2029								15'620																	
							500	3								0								2029						2		12'500																	
							1'082	1								0								2029								27'038																	
							734	3	241							337'400								2029					1		18'350																		
							674	1								0								2029								16'845																	
							603	1	126							176'400								2029								15'070																	
							989	3								0								2029								24'725	1																
							972	2								0								2029						3		24'295																	
							698	3								0								2029						2		17'445																	
							500	1								0								2029								12'495																	
							927	1								0								2029								23'183																	
							550	1	1'413							1'978'200								2029								13'750																	
							691	3								0								2029								17'280	1																
							752	3								0								2029								18'795	1																
							611	3	108							151'200								2029								15'275	4																
							715	3								0								2029								17'870	6																
							937	1								0								2029								23'420																	
							776	1								0								2029								19'395																	
							508	3								0								2029								12'700	4																
							578	3								0								2029								14'660	4																
							604	3	831							1'163'400								2029								15'100	2																
							521	3								0								2029								13'020	2																
							543	3	861							1'205'400								2029								13'575	18																

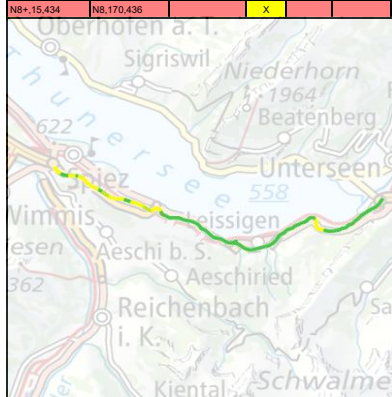
Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle		
RBBS von / bis		LSP nicht notwendig		LSP notwendig		ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Globale Note	Realisierte Lärmschutzmassnahmen							Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Projektbezeichnung gemäss BKM										Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen					Anzahl Gebäude mit Lr >IGW			
		Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belaug Kat. II, z.B. PA (m²)	Belaug Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)						Andere (Kosten in CHF)	Erdicherungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Projektphase					Einreichung AP bei GS-UVEK					PGV Datum	PGV rekrutierung?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belaug Kat. II, z.B. PA (m²)	Belaug Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erdicherungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen
																MP-Nr.	Bezeichnung	G/PEK	AP/AMK	DP/MP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	Nein	Ja													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
Nb+0,0	Nb+110,846	X						14'330		29'990	2'400	0	162'900		98	84'633'900	490	304								520	0		0	243'975	0	33	1'129'975	131				
								501	3				12'500																					Gebäude der N1 zugeordnet				
								501	3	170			12'500		1'115'000	1'365'500																4	0					
								502	2				12'500			12'500																1	0					
								483	1							0			130026	Bern BUGAW Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf		X			04.10.2021	Bern BUGAW Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf	01.05.2025		2029	520			62'500		7	948'500		
								501	2							0			130026	Bern BUGAW Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf		X			04.10.2021	Bern BUGAW Umgestaltung Gebiet Anschluss Wankdorf	01.05.2025		2029			12'500		3	12'500			
								508	1	1'150				12'750		4	1'622'750																0		Abnahme ZEL Bern PUN Wankdorf - Muri in Bearbeitung			
								496	1					12'500		5	12'500																0		Abnahme ZEL Bern PUN Wankdorf - Muri in Bearbeitung			
								690	1	10'850				17'500		32	15'207'500																0		Abnahme ZEL Bern PUN Wankdorf - Muri in Bearbeitung			
								270	1					6'750	40'250'000	3	40'256'750																0		Überdeckung Sonnenhof (322m * 25m * 5'000 -/m2)			
								548	1	6'740				13'500		3	9'449'500																	0		Abnahme ZEL Bern PUN Wankdorf - Muri in Bearbeitung		
								500	1	870				12'500		1	1'230'500																	0		Abnahme ZEL Bern PUN Wankdorf - Muri in Bearbeitung		
								500	1	1'110				12'500		7	1'566'500																	0		Abnahme ZEL Bern PUN Wankdorf - Muri in Bearbeitung		
								385	1	1'730				9'650		7	2'431'650																	0		Abnahme ZEL Bern PUN Wankdorf - Muri in Bearbeitung		
								611	1	4'300	1000			15'250		24	6'735'250																	0		Abnahme ZEL Bern PUN Wankdorf - Muri in Bearbeitung		
								503	1	580				12'500		12	824'500																	0		Abnahme ZEL Bern PUN Wankdorf - Muri in Bearbeitung		
							502	3								0			80295	EP Muri - Rubigen		X																
							507	3		110	900					784'000			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							410	1								0			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							638	3								0			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							492	1								0			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							301	2								0			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							481	3		0	500					350'000			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							507	3								0			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							996	1								0			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							501	3								0			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							497	3								0			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													
							999	3	1'980							2'772'000			80295	EP Muri - Rubigen		X			01.03.2025													

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																alle			
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig	LSP notwendig	Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Globalkote	Realisierte Lärmschutzmassnahmen							Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEK	PGV Datum	PGV rektifiziert?	Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen									Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		
	bis 2015 notwendig ?	bis 2015 notwendig ?						Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belaug Kat. II, z.B. PA (m²)	Belaug Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erdsicherungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen		GPIEK	AP/MK	DP/MF	Realisierung					Datum	Projektbezeichnung	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belaug Kat. II, z.B. PA (m²)	Belaug Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erdsicherungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)			Planungshorizont mit realisierten vorgesehenen Massnahmen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
Nb+120.386	Nb+250.943	X					14'575		13'210	6'090	0	332'590	0		23'99'569	314	84									0	0		0	0	0	5					
							84	3				12'200			1'890																0						
							488	1				12'200																			0						
							823	3				20'565																			0						
							729	3	250	1500		16'230			1'418'230																0						
							398	1	2'340	3200		9'950			5'525'950																0						
							413	1	250	610		10'328			787'328																0						
							477	3	1'100			11'925			1'551'925																0						
							804	1				20'110			20'110																0						
							834	1				20'855			20'855																0						
							814	1				20'350			20'350																0						
							490	2	2'170			12'259			3'050'250																0						
							601	3	2'290			15'014			3'221'014																0						
							776	2	1'060			19'390			1'503'390																0						
							400	3				10'000			10'000																0						
							609	3	2'150			15'250			3'025'250																0						
							590	3	810	780		14'750			1'694'750																0						
							395	1				6'500			6'500																0		Abschluss ZEL in Bearbeitung				
							1762'0,162	1	180			4'500		1	256'500																0		Abschluss ZEL in Bearbeitung Bez. ZEL: 0 +182 (1)				
							N6_AKES.40,27	1	371			9'273			9'273																0		Abschluss ZEL in Bearbeitung				
							N6_AKES.14,187	3	406			10'350		1	10'350																0		Abschluss ZEL in Bearbeitung				
							N6_-220,91	1	837			15'100			15'100																0		Abschluss ZEL in Bearbeitung Bez. ZEL: 210 +418 (3)				
							N6_-220,931	1	278			5'100			5'100																0		Abschluss ZEL in Bearbeitung Bez. ZEL: 220 +569 (5)				
							N6_-230,215	3	852			15'300		3	15'300																0		Abschluss ZEL in Bearbeitung Bez. ZEL: 230 +481 (6)				
							N6_-240,67	1	525			9'400			9'400																0		Abschluss ZEL in Bearbeitung Bez. ZEL: 240 +65 (7)				
							N6+240.590	1	699			12'700			12'700																0		Abschluss ZEL in Bearbeitung Bez. ZEL: 240 +769 (8)				
							N6+250.291	3	652		610				865'800																0						

[illegible]

Stand/Datum: 05.Jun 2025 Elvis Mehic 193

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle									
RBB5 von / bis	LSP nicht notwendig	LSP notwendig	bis 2015 notwendig ?	Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Vlum	Beurteilungsab- schnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungs- abschnittes	Länge (m)	Globalhöhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Projektbezeichnung gemäss BKM	Projektphase				Einreichung AP bei GS-UV/EK	PGV Datum	PGV rechteckig? Nein Ja	Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen								
									Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Behag Kat. II, z.B. PA (m²)	Behag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	MP-Nr.		Bezeichnung	G/PEK	AP/AMK	DP/MP					Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	PGV Datum	Nein	Ja	Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Realisierungsbeginn			Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m²)	Behag Kat. II, z.B. PA (m²)	Behag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34												
N6,0,346			X				10'469		0	0	0	0	0	0	0	52									0	0	0	16'430	0	30	16'430	5													
N6,0,346							454	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,730,388 Bez. Kl VS: gam 509 a et b (Km 0.35 - Km 0.8)												
N6,0,345							344	5							0													3'440		1	3'440		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,730,842 / Massnahmen aus ZEL Bez. Kl VS: nig 509 a (Km 0.0 - Km 0.35)												
N6,0,800							500	3							0													5'000		5	5'000		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,720,888 / Massnahmen aus ZEL Bez. Kl VS: gam 509 c (Km 0.8 - Km 1.3)												
N6,10,300							299	3							0													2'990		21	2'990		Bez. Bericht ZEL 2023: undefiniert (Teilstück von N6,720,388) / Massnahmen aus ZEL Bez. Kl VS: gam 509 c et ste 509 a (Km 1.3 - Km 1.8)												
N6,10,800							500	5							0													5'000		2	5'000		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,710,888 / Massnahmen aus ZEL Bez. Kl VS: ste 509 a et b (Km 1.8 - Km 2.3)												
N6,20,300							500	5							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,710,388 Bez. Kl VS: ste 509 c et d (Km 2.3 - Km 2.8)												
N6,20,800							200	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,710,188 Bez. Kl VS: ste 509 d (Km 2.8 - Km 3.0)												
N6,30,0							500	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,700,688 Bez. Kl VS: ste 509 e et hoh 509 ab (Km 3.0 - Km 3.5)												
N6,30,500							500	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,700,188 Bez. Kl VS: hoh 509 b, c et d (Km 3.5 - Km 4.0)												
N6,40,0							500	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,690,688 Bez. Kl VS: hoh 509 d (Km 4.0 - Km 4.5)												
N6,40,500							300	5							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,690,388 Bez. Kl VS: hoh 509 a (Km 4.5 - Km 4.8), nur unüberbaute Parzellen (2016)												
N6,40,800							2'510	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,660,878 Bez. Kl VS: hoh 509 f et ste 509 f (Km 4.8 - Km 7.3), Tunnel												
N6,70,312							389	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,660,489 Bez. Kl VS: ste 509 g (Km 7.3 - Km 7.7)												
N6,70,701							400	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,660,89 Bez. Kl VS: ste 509 g (Km 7.7 - Km 8.1)												
N6,80,99							501	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,650,589 Bez. Kl VS: ste 509 g (Km 8.1 - Km 8.6)												
N6,80,599							501	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,650,88 Bez. Kl VS: ste 509 g (Km 8.6 - Km 9.1)												
N6,90,100							500	5							0															1	0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,640,588 / Massnahmen aus ZEL Bez. Kl VS: ste 509 g (Km 9.1 - Km 9.6)												
N6,90,600							200	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,640,388 Bez. Kl VS: fer 509 a et b (Km 9.6 - Km 9.8)												
N6,90,800							200	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,640,189 Bez. Kl VS: fer 509 c (Km 9.8 - Km 10.0)												
N6,90,1000							300	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,637B,172 Bez. Kl VS: fer 509 d (Km 10.0 - Km 10.3)												
N6,100,300							171	1							0																0		Bez. Bericht ZEL 2023: N6,637B,0 Bez. Kl VS: fer 509 e (Km 10.3 - Km 10.6)												
N6,10,600							200	5							0																0		neuer Beurteilungsabschnitt (Teilstück von N6, 720,388) Bez. Bericht ZEL 2023: nicht definiert												

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																	alle					
		LSP nicht notwendig	LSP notwendig				ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Globalnote	Realisierte Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW	Bemerkungen / Kommentar									
		Nein	Ja	bis 2015 notwendig ?		Lärmschutzwand (m²)						Lärmschutzdämm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA B - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erdbehebungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Projektphase				Einreichung AP bei GS-UV/EK				PGV Datum	POV rechtskettig?	Datum Genehmigung DP		Vorgehensweise Realisationsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA B - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erdbehebungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten und vorgesehenen Massnahmen
RBBSt von / bis																																								
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19		20		21		22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
N8+15.434	N8.170.436	X						15'614		3'444	0	0	0	880'000	12	5'701'040	213	92												273	0	0	299'284	0	56	763'384	76			
																																								
N8+15.434								249	3	200						280'000																								
N8.20.176								210	1							0																								
N8.20.388								268	1	590						826'000																								
N8.20.657								133	3	540						1'016'000																								
N8.20.789								251	1							360'000		360'000																						
N8.30.42								361	3	583						1'075'640																								
N8.30.403								493	3	667						933'800																								
N8.30.896								318	1							0																								
N8.40.218								349	2							0																								
N8.40.567								361	3							0																								
N8.40.927								254	3							0																								
N8.50.184								279	1							0																								
N8.50.465								383	3							0																								
N8.50.851								531	2	681						953'400																								
N8.60.387								471	3							0																								
N8.60.852								447	1							0																								
N8.70.299								351	1							0																								
N8.70.652								1'003	1							0																								
N8.80.652								711	1							2	0																							
N8.90.360								711	1							2	0																							
1444.0.346								131	1							0																								
N8.100.76								2'096	1							0																								
N8.120.174								302	1							2	0																							
N8.120.480								263	1							0																								
N8.120.743								298	1							1	0																							
N8.130.43								478	1							0																								
N8.130.520								334	1							0																								
N8.130.851								630	3	183						256'200																								
N8.140.478								214	3							0																								
N8.140.692								552	1							0																								
N8.150.241								458	1							0																								
N8.150.695								1'040	1							0																								
N8.160.741								694	1							0																								

Filiale F2 **N8/60 Interlaken Ost- Unterbach**
Stand/Datum: 05.Jun 2025 Elvis Mehic **52**

Erhaltungsplanung (EP)										Projektmanagement (PM)																		alle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LSP nicht notwendig		LSP notwendig		bis 2015 notwendig ?	Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gefälle	Realisierte Lärmschutzmassnahmen							Anzahl Gebäude mit Lr > IGV		Projektmanagement (PM)										Anzahl Gebäude mit Lr > IGV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										Lärmschutzwand (m²)	Lärmschuttdamm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere Kosten in CHF	Erleichterungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RBBS von / bis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											


[illegible]

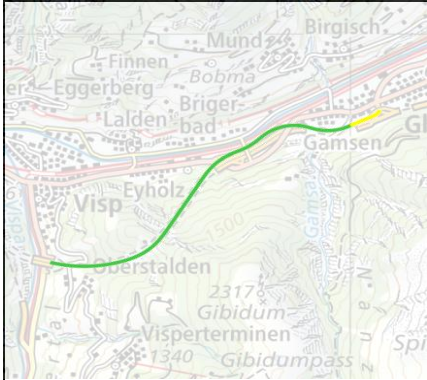
Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																	alle	
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig	LSP notwendig	bis 2015 notwendig ?		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsab- schnitt gemäss ASTRA L7	Pixel-ID; Identifikation des Beurteilungs- abschnittes	Länge (m)	Globenhöhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW																		
	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m³)								Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erficherungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen																				
Projektbezeichnung gemäss BKM											Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEK		PGV Datum	PGV rechtfertigt?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr >IGW							
MP-Nr.	Bezeichnung										GPIEX	AP/MK	DP/MP	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung		Datum	Nein		Ja	Vorgesehener Realisationsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdamm (m³)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erficherungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten MS vorgesehenen Massnahmen						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
NH+880,3	NH+1010,425	X					16'343		2'750	0	349'402	24'981	0		5'971'390	60	2								0	0		0	0	0	2					
							500	2	410			12'501			5'861'901										0	0		0	0		0					
							500	1	1'000			12'498			1'474'975																0					
							499	2	190			12'480			278'480																0					
							499	1				12'470			74'819																0					
							500	1				12'498			74'990																0					
							500	1	1'000			12'506			1'475'033																0					
							501	1	150			12'516			285'093																0					
							500	1				12'502			75'009																0					
							500	1				12'509			75'053																0					
							500	1				12'488			74'925																0					
							499	1				12'485			74'912																0					
							500	1				12'491			74'945																0					
							300	1				7'509			45'056																0					
							828	3				20'701			124'209																0					
							869	1				21'725			130'350																0					
							889	1				22'230			133'380																0					
							505	1				12'629			75'774																0					
							563	3				14'076			84'456																0					
							1'166	1				29'147			174'882																0					
							899	1				22'469			134'814																0					
							626	1				15'650			93'900																0					
							696	2				17'407			104'442																0					
							870	2				21'762			130'572																0					
							765	3				10'137			114'824																0					
							257	3							0																0					
							645	1							0																0					
							467	3							0																0					

[illegible]

[illegible]

Filiale F2 **N9/68 Visp West-Brig-Glis**
Stand/Datum: 05.Jun 2025 Elvis Mehic **117**

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																		alle		
RBBSt von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gloabnote	Realisierte Lärmschutzmassnahmen							Anzahl Gebäude mit Lr >IGW		Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen										Anzahl Gebäude mit Lr >IGW	Bemerkungen / Kommentar								
	bis 2015 notwendig ?	Nein	Ja	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen						Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen	Projektbezeichnung gemäss BKM		Projektphase				Einreichung AP bei GS-UVEX	PGV Datum	PGV rechtskräftig?		Datum Genehmigung DP	Vorgesehene Realisierungsbeginn		Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Baug Kat. II, z.B. PA (m²)	Baug Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Kosten Lärmschutz-massnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen
																		MP-Nr.	Bezeichnung	G/PEK	AP/AMK	DP/MP	Realisierung			Datum	Projektbezeichnung											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
N9+ 1420,793	N9+ 1520,50	X					7'477		2'161	729	0	0	0	0	3'535'700	4	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eroffnung Tunnel Holzof am 13.04.2018; Pixel in MISTRA LBK erfasst (nur aktuell in Betrieb stehende Teilstrecke)				
	N9+ 1420,793						4260	1							0															0								
	N9+ 1470,69						184	1							0															0								
	N9+ 1480,990						932	1	1'162						1'626'800															0								
	N9+ 1490,930						510	1							0															0			keine IGW-Überschreitung. PW-Überschreitung nur bei Parzellen => GN1 statt GN3					
	N9+ 1500,449						1'012	1							0															0								
	N9+ 1510,472						579	3	999	729					1'908'900															0			IGW: keine Gebäude überschritten, nur Parzellen (Anzahl 6). Industriegebiet.					



[illegible]

	Erhaltungsplanung (EP)										Projektmanagement (PM)																		alle									
	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / View	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pizel-ID: Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Gibshole	Realisierte Lärmschutzmassnahmen							Anzahl Gebäude mit Lr > HW		PGV Datum	PGV rechteckig?	Datum Benennung DP	Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen								Anzahl Gebäude mit Lr > HW								
			bis 2015 notwendig?							Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)	Wert Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont einer realisierten Massnahme	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen				Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Belag Kat. II, z.B. PA (m²)	Belag Kat. I z.B. SDA 6 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erleichterungen (Anzahl)			Kosten Lärmschutzmassnahmen (CHF)	Planungshorizont mit realisierten und vorgeschrittenen Massnahmen						
																																	MP-Nr.	Bezeichnung	GPEK	APMK	DPAMP	Realisierung
RBBS von / bis	3	Non	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
N95.220.480	N95SI.202.499	X						20'490		0	0	0	0	0	7	0	15	6								0	0	0	0	0	6	0	6					
										N95.220.480	453	1					0																0					
										N95.220.910	543	2					0																0					
										N95.230.458	457	1					0																0					
										N95.230.916	890	1					0																0					
										N95.240.799	1'138	1					0																	0				
										N95.250.924	940	1					0																	0				
										N95.260.856	257	1					0																	0				
										N95.270.130	11811	1					0																	0				
										N95.280.734	420	1					0																	0				
										N95.290.150	694	1					0																	0				
										N95.290.831	314	2					0																	0				
										N95.300.140	860	1					0																	0				
										N95.300.998	922	1					0																	0				
										N95.310.916	666	1					0																	0				
										N95.320.664	718	1					0																	0				
										N95.330.450	1'005	1					0																	0				
										N95.340.439	682	1					0																	0				
										N95.350.108	314	1					0																	0				
										N95.350.424	275	2					0																	0				
										N95.350.708	1'134	1					0																	0				
										N95.360.831	416	1					0																	0				
										N95.370.236	1'570	1					0																	0				
										N95.380.796	644	1					0																	0				
										N95.390.418	1'878	1					0																	0				
										N95.410.270	751	1				7	0																	0				
										N95.420.13	368	1					0																	0				
										N95.420.355	201	1					0																		0			
										N95SI.202.120	379	1					0																		0			

Erhaltungsplanung (EP)																		Projektmanagement (PM)																	alle
RBBS von / bis	LSP nicht notwendig		LSP notwendig		Letzte Aktualisierung ASTRA LB Datum / Visum	Beurteilungsabschnitt gemäss ASTRA LB	Pixel-ID; Identifikation des Beurteilungsabschnittes	Länge (m)	Globalhöhe	Realisierte Lärmschutzmassnahmen						Anzahl Gebäude mit Lr >IGW												Anzahl Gebäude mit Lr >IGW							
	bis 2015 notwendig ?	Nein	Ja	Lärmschutzwand (m²)						Lärmschutzdämm (m²)	Bühlg Kat. II, z.B. PA (m²)	Bühlg Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)	Andere (Kosten in CHF)	Erdbeckenungen (Anzahl)	Wert Lärmschutz- massnahmen (CHF)	Planungshorizont ohne realisierte Massnahmen	Planungshorizont mit realisierten Massnahmen																		
																		MP-Nr.	Bezeichnung	GPEK	AP/AMK	DP/MF	Realisierung	Datum	Projektbezeichnung	PGV Datum	PGV rechteckig? Nein Ja			Datum Genehmigung DP	Vorgesehener Realisierungsbeginn	Lärmschutzwand (m²)	Lärmschutzdämm (m²)	Bühlg Kat. II, z.B. PA (m²)	Bühlg Kat. I, z.B. SDA 8 - 12 (m²)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15a	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
N21,40,548	N21,140,813	X					10'272		0	0	0		0	0	0	140								0	0	0	56'910	0	138	56'910	140	mac.a21.a et b (Km 4.5 - Km 5.0)			
					N21,40,548		135	3							0			ZEL												0		mac.a21.c à e (Km 5.0 - Km 5.7)			
					N21,40,685		261	3							0			ZEL												0		mac.a21.f (Km 5.7 - Km 6.1) / Massnahmen aus ZEL			
					N21,40,967		754	3							0			ZEL								7540		16		7540		mac.a21.g (Km 6.1 - Km 6.4) / Massnahmen aus ZEL			
					N21,50,715		382	3							0			ZEL								3820				3820		mac.a21.h (Km 6.4 - Km 6.9) / Massnahmen aus ZEL			
					N21,60,104		327	3							0			ZEL								3270		12		3270					
					N21,60,406		495	1							0			ZEL												0					
					N21,60,880		405	1						0	0			ZEL												0					
					N21,70,287		326	3							0			ZEL												0		Massnahmen aus ZEL			
					N21,70,605		471	3							0			ZEL												0		Massnahmen aus ZEL			
					N21,80,112		510	3							0			ZEL												0		Massnahmen aus ZEL			
					N21,80,615		501	3							0			ZEL												0		Massnahmen aus ZEL			
					N21,90,113		698	3							0			ZEL												0		Massnahmen aus ZEL			
					N21,90,978		401	1							0			ZEL												0		Massnahmen aus ZEL			
					N21,100,150		752	1							0			ZEL												0		Massnahmen aus ZEL			
					N21,100,968		429	1							0			ZEL												0		Massnahmen aus ZEL			
					N21,110,410		472	1							0			ZEL												0		vol a21.a et b (Km 12.6 - Km 13.2), nur unüberbaute Parzellen, Erschliessungsdatum noch verifizieren vor/nach 1.1.1985)			
					N21,110,880		555	1							0			ZEL												0		0			
					N21,120,395		224	1							0			ZEL												0		0			
					N21,120,598		593	1							0			ZEL												0		0			
					N21,130,193		260	1							0			ZEL												0		0			
					N21,130,518		818	3							0			ZEL												0		Massnahmen aus ZEL			
					N21,140,319		503	3							0			ZEL									8180	40	8'180	5'030	5'030	0	Massnahmen aus ZEL		

